

CYL3					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-73.978	-73.958	0.020	-0.100	0.100
Y	-119.358	-119.346	0.012	-0.100	0.100
Z	19.010	19.031	0.021	-0.100	0.100
D	14.000	14.000	0.000	-0.150	0.150

CYL4					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-73.496	-73.450	0.046	-0.100	0.100
Y	-42.848	-42.845	0.003	-0.100	0.100
Z	29.814	29.831	0.017	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

CYL6					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-77.516	-77.533	-0.017	-0.100	0.100
Y	20.086	20.029	-0.057	-0.100	0.100
Z	28.107	28.121	0.013	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

CYL1					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-182.031	-182.063	-0.032	-0.100	0.100
Y	-157.858	-157.876	-0.018	-0.100	0.100
Z	-43.484	-43.428	0.055	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

CYL7					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-77.516	-77.552	-0.036	-0.100	0.100
Y	78.376	78.398	0.022	-0.100	0.100
Z	27.102	27.120	0.018	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

CYL2					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-185.031	-185.063	-0.032	-0.100	0.100
Y	-119.358	-119.376	-0.018	-0.100	0.100
Z	25.010	25.051	0.041	-0.100	0.100
D	14.000	14.000	0.000	-0.150	0.150

CYL5					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-73.496	-73.460	0.036	-0.100	0.100
Y	-2.648	-2.625	0.023	-0.100	0.100
Z	29.814	29.851	0.037	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

CYL8					
	理论	实际	误差	公差-	公差+
X	-116.691	-116.659	0.032	-0.100	0.100
Y	78.878	78.838	-0.040	-0.100	0.100
Z	36.681	36.628	-0.053	-0.100	0.100
D	10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150

单位 : 毫米, 角度

操作者 :

日期 : 2024/9/5 20:27:05

工件号 :

工作号 :

PROFP合格率 : N/A

RationalDMIS

武汉力加成科技有限公司

CYL14					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -182.498	-182.460	0.038	-0.100	0.100	
Y -14.237	-14.294	-0.057	-0.100	0.100	
Z 33.637	33.674	0.036	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL13					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -161.413	161.471	0.058	-0.100	0.100	
Y -0.014	-0.081	-0.067	-0.100	0.100	
Z 37.178	37.148	-0.030	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL10					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -131.021	131.052	0.031	-0.100	0.100	
Y 183.038	183.064	0.026	-0.100	0.100	
Z -43.484	-43.428	0.055	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL9					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -137.521	137.552	-0.031	-0.100	0.100	
Y 149.932	149.963	0.031	-0.100	0.100	
Z 34.567	34.527	-0.040	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL11					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -169.604	169.650	-0.046	-0.100	0.100	
Y 157.638	157.664	0.026	-0.100	0.100	
Z 26.016	26.052	0.035	-0.100	0.100	
D 16.000	16.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL15					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -182.498	-182.430	0.068	-0.100	0.100	
Y -54.437	-54.494	-0.057	-0.100	0.100	
Z 33.637	33.694	0.056	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

CYL12					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -182.498	-182.460	0.038	-0.100	0.100	
Y 31.290	31.259	-0.031	-0.100	0.100	
Z 33.637	33.634	-0.004	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	


CYL16					
理论	实际	误差	公差-	公差+	
X -182.498	-182.430	0.068	-0.100	0.100	
Y 71.490	71.429	-0.061	-0.100	0.100	
Z 33.637	33.694	0.056	-0.100	0.100	
D 10.000	10.000	0.000	-0.150	0.150	

单位 : 毫米, 角度
 操作者 :
 日期 : 2024/9/5 20:27:06

工件号 :
 工作号 :
 PROFP合格率 : N/A

RationalDMIS

武汉力加成科技有限公司

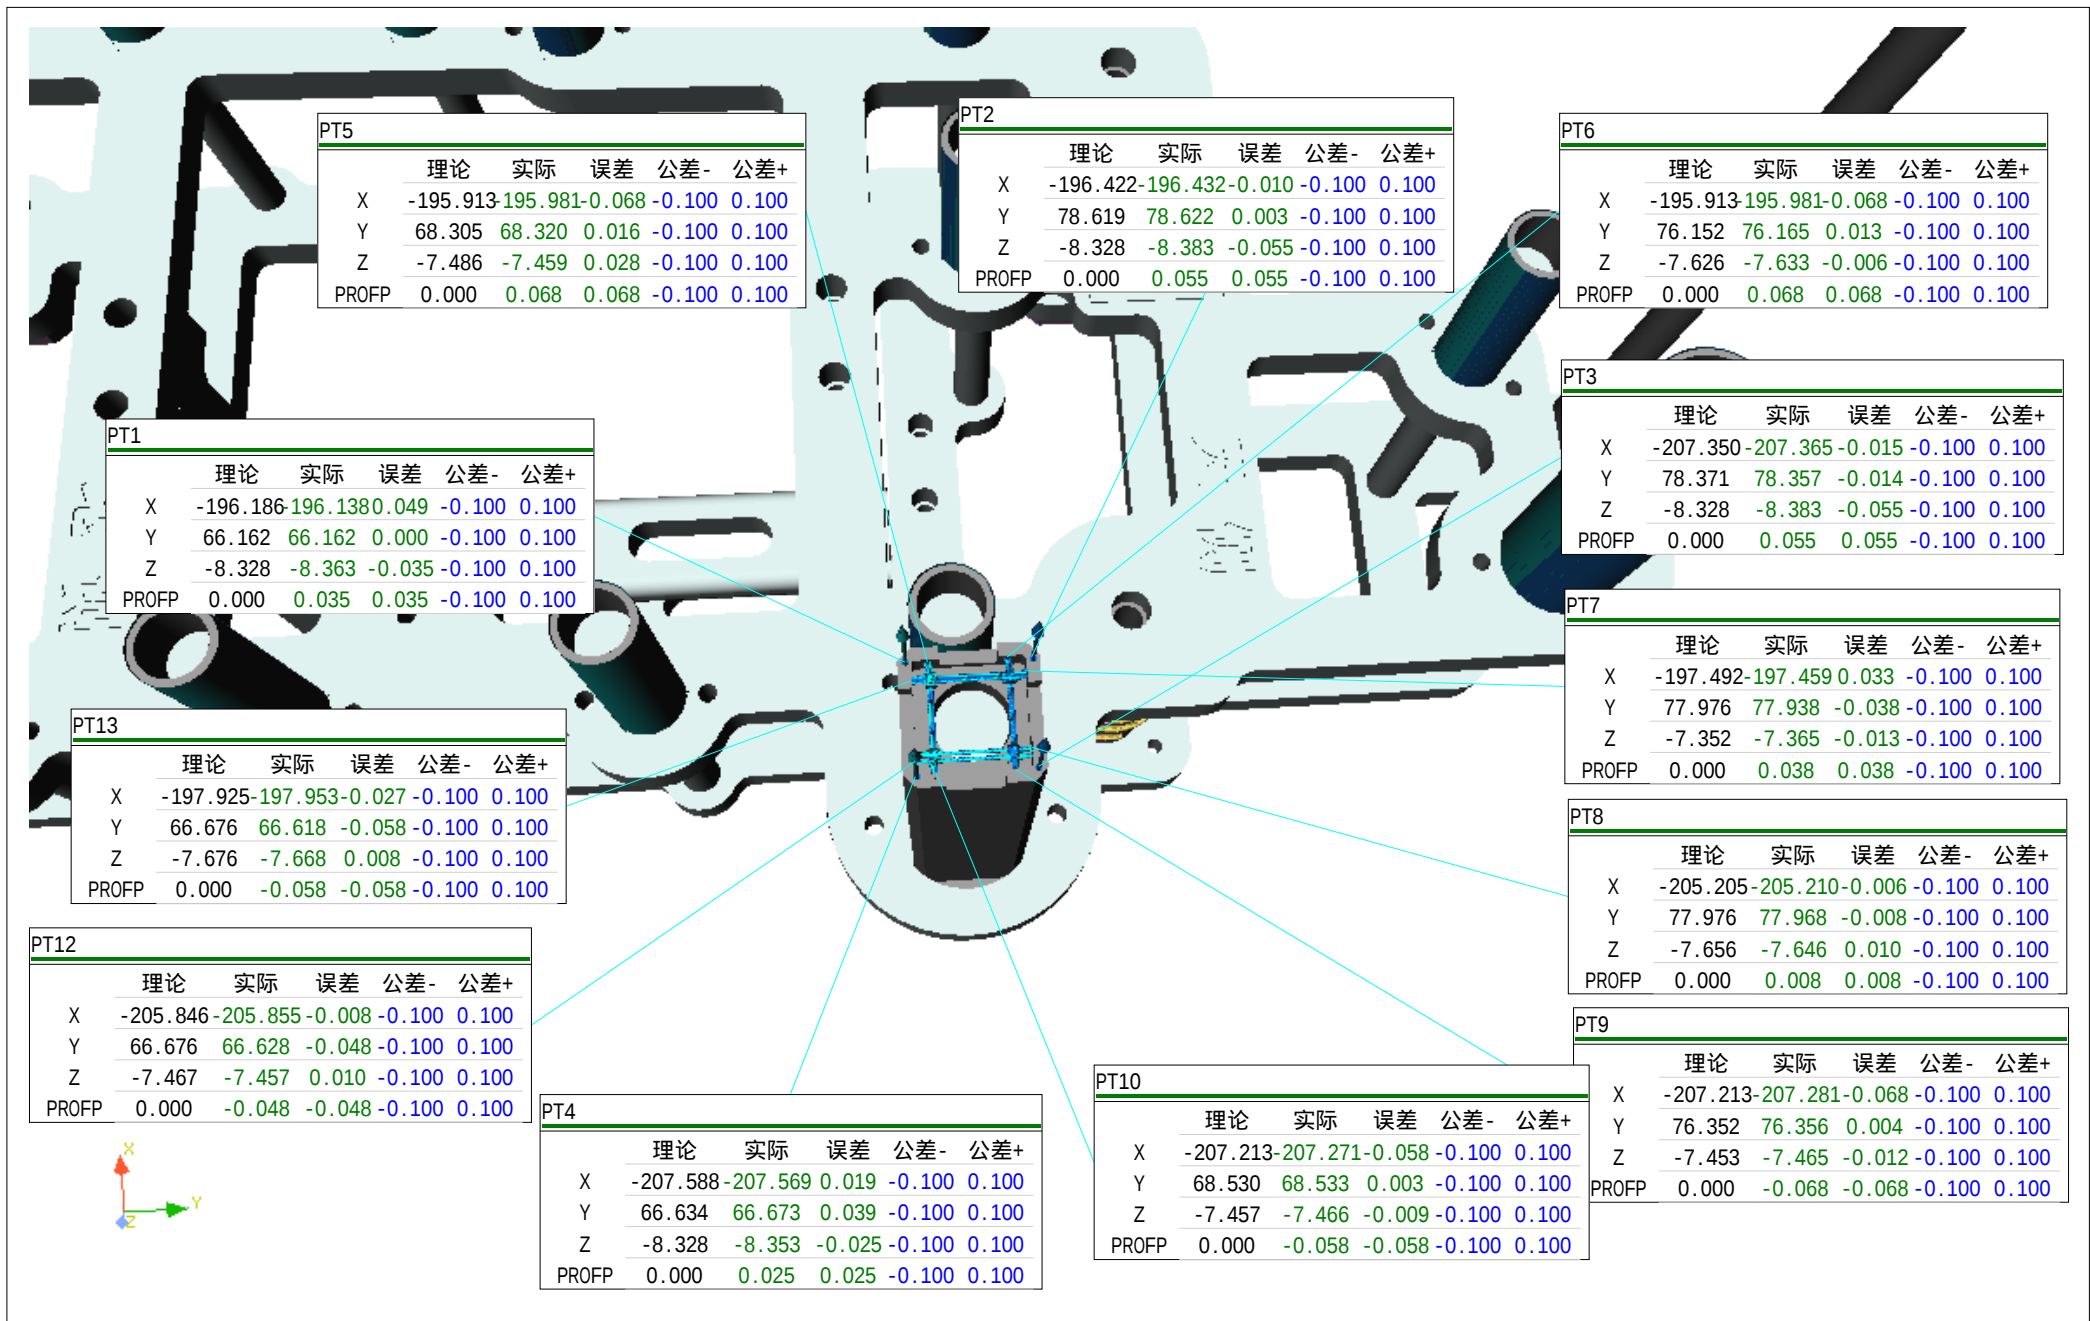

单位 : 毫米, 角度
操作者 :
日期 : 2024/9/5 20:27:07

工件号 :
工作号 :
PROFP合格率 : 100% (12/12)

RationalDMIS 武汉力加成科技有限公司
